

COMUNE CISTERNA DI LATINA

Provincia di LATINA

ALLEGATO "C" DEL P.S.C.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI
ARCHITETTONICI DEL GIARDINO DI NINFA"

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF (DPR 26 Aprile 2013 n° 82)

COMMITENTE: FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS

RESP. LAVORI : ARCH. ARMANDINA ANTOBENEDETTO

Il Coordinatore per la Sicurezza

ARCH. LOFFARELLI PASQUALE

Priverno, 05 AGOSTO 2019

<u>Revisione</u>	<u>Data</u>	<u>Oggetto della revisione</u>	<u>Tecnico</u>
.....
.....

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	09/09/2019	10/09/2019
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	10/09/2019	10/09/2019
	1	E	1	1	16/09/2019	16/09/2019
	1	E	1	1	07/01/2020	07/01/2020
	1	E	1	1	10/02/2020	10/02/2020
	1	E	1	1	14/04/2020	14/04/2020
	1	E	1	1	15/06/2020	15/06/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	11/09/2019	12/09/2019
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1	13/09/2019	13/09/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	12/09/2019	12/09/2019
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/09/2019	13/09/2019
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	13/07/2020	14/07/2020
COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DELLA CITTÀ DI NINFA						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	5	16/09/2019	20/09/2019
	1	E	5	5	23/09/2019	27/09/2019
	1	E	4	4	07/01/2020	10/01/2020
	1	E	3	3	20/01/2020	22/01/2020
	1	E	2	2	27/01/2020	28/01/2020
Nolo piattaforma aerea	1	E	1	1	20/09/2019	20/09/2019
	1	E	2	2	18/11/2019	19/11/2019
RIMOZIONE E SMALITIMENTO in discarica controllata di serbatoi in eternit-amianto, effettuato da ditta specializzata. (COPERTURA A)	1	E	1	1	20/09/2019	20/09/2019
RIMOZIONE E SMALITIMENTO elementi tubolari metallici e serbatoi impianto dismesso	1	E	1	1	20/09/2019	20/09/2019
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	5	5	30/09/2019	04/10/2019
RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA	1	E	3	3	07/10/2019	09/10/2019
RIMOZIONE SOTTOMANTO in tavelle, tavelloni o tavolato	1	E	3	5	10/10/2019	14/10/2019
Demolizione della muratura in corrispondenza degli appoggi,	1	E	2	2	14/10/2019	15/10/2019
RESTAURO MURATURE. Riconfigurazione paramento murario prospetti in corrispondenza delle testate delle travi ammassate	1	E	3	3	16/10/2019	18/10/2019
RESTAURO MURATURE. Consolidamento giunti paramento murario prospetti	1	E	1	1	21/10/2019	21/10/2019
Disinfestazione e protezione degli elementi lignei	1	E	2	2	22/10/2019	23/10/2019
Applicazione e installazione di esche per la cattura delle colonie di termiti	1	E	2	2	24/10/2019	25/10/2019
fornitura e posa in opera di travi di legno rettificata	1	E	4	4	28/10/2019	31/10/2019
Realizzazione di un manto impermeabile	1	E	2	2	04/11/2019	05/11/2019
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	3	3	06/11/2019	08/11/2019
	1	E	5	5	11/11/2019	15/11/2019
Revisione e consolidamento comignoli in muratura.	1	E	3	3	18/11/2019	20/11/2019
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	2	2	21/11/2019	22/11/2019
	1	E	3	3	25/11/2019	27/11/2019
Restauro di catene antiche in ferro a vista,	1	E	1	1	27/11/2019	27/11/2019

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di "sistema di areazione/ventilazione"	1	E	2	2	28/11/2019	29/11/2019
Revisione del manto di copertura	1	E	5	5	25/11/2019	29/11/2019
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio	1	E	2	2	02/12/2019	03/12/2019
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio	1	E	2	2	04/12/2019	05/12/2019
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni	1	E	5	5	09/12/2019	13/12/2019
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	5	5	16/12/2019	20/12/2019
AERA NUOVO INGRESSO + TORRE AREA SMM						
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA						
	1	E	3	3	07/01/2020	09/01/2020
	1	E	2	2	06/02/2020	07/02/2020
Nolo piattaforma aerea	1	E	1	1	09/01/2020	09/01/2020
Diserbamento ed estirpazione	1	E	2	2	09/01/2020	10/01/2020
	1	E	2	2	13/01/2020	14/01/2020
Restauro ed impermeabilizzazione delle sommità	1	E	3	3	15/01/2020	17/01/2020
Reintegrazione di lacune e ripresa di muratura in caso di crolli,	1	E	5	5	20/01/2020	24/01/2020
Stilatura dei giunti. Rimozione delle parti di malte interstiziali tra i conci,	1	E	5	5	27/01/2020	31/01/2020
Sarcitura di grosse lesioni strutturali da 2 a 5 cm di murature	1	E	3	3	03/02/2020	05/02/2020
CASA A SCHIERA (AREA SMM)						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso						
	1	E	5	5	10/02/2020	14/02/2020
	1	E	2	2	17/02/2020	18/02/2020
	1	E	5	5	06/04/2020	10/04/2020
Nolo piattaforma aerea	1	E	2	2	24/02/2020	25/02/2020
	1	E	3	3	02/03/2020	04/03/2020
	1	E	3	3	09/03/2020	11/03/2020
	1	E	3	3	16/03/2020	18/03/2020
	1	E	3	3	23/03/2020	25/03/2020
Rimozione materiale di crollo	1	E	3	3	19/02/2020	21/02/2020
Diserbamento ed estirpazione	1	E	5	5	24/02/2020	28/02/2020
PULITURA DELLE SUPERFICI LAPIDEE CON LAVAGGIO A BASSA PRESSIONE	1	E	5	5	02/03/2020	06/03/2020
PULITURA DEL PARAMENTO LITOIDE	1	E	5	5	09/03/2020	13/03/2020
Stilatura dei giunti. Rimozione delle parti di malte interstiziali tra i conci,	1	E	5	5	16/03/2020	20/03/2020
Sarcitura di grosse lesioni strutturali da 2 a 5 cm di murature	1	E	5	5	23/03/2020	27/03/2020
Iniezioni di consolidamento strutturale di murature faccia vista	1	E	5	5	30/03/2020	03/04/2020
RETRO ABSIDE S. MARIA MAGGIORE						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso						
	1	E	4	4	14/04/2020	17/04/2020
	1	E	3	3	20/04/2020	22/04/2020
	1	E	4	4	09/06/2020	12/06/2020
Nolo piattaforma aerea	1	E	2	2	27/04/2020	28/04/2020
	1	E	2	2	04/05/2020	05/05/2020
	1	E	2	2	11/05/2020	12/05/2020
	1	E	2	2	18/05/2020	19/05/2020
Rimozione materiale di crollo	1	E	2	2	23/04/2020	24/04/2020
Diserbamento ed estirpazione	1	E	4	4	27/04/2020	30/04/2020
	1	E	5	5	04/05/2020	08/05/2020
Restauro ed impermeabilizzazione delle sommità	1	E	5	5	11/05/2020	15/05/2020
Reintegrazione di lacune e ripresa di muratura in caso di crolli,	1	E	5	5	18/05/2020	22/05/2020

Tabella Analitica Gantt

Stilatura dei giunti. Rimozione delle parti di malte interstiziali tra i conci,	1	E	5	5	25/05/2020	29/05/2020
Sarcitura di grosse lesioni strutturali da 2 a 5 cm di murature	1	E	1	1	07/05/2020	07/05/2020
Iniezioni di consolidamento strutturale di murature faccia vista	1	E	3	3	03/06/2020	05/06/2020
	1	E	1	1	08/06/2020	08/06/2020
LA DOGANA						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	3	15/06/2020	17/06/2020
	1	E	2	2	13/07/2020	14/07/2020
Nolo piattaforma aerea	1	E	1	1	22/06/2020	22/06/2020
	1	E	1	1	02/07/2020	02/07/2020
Diserbamento ed estirpazione	1	E	2	2	18/06/2020	19/06/2020
	1	E	1	1	22/06/2020	22/06/2020
PULITURA DELLE SUPERFICI LAPIDEE CON LAVAGGIO A BASSA PRESSIONE	1	E	2	2	02/07/2020	03/07/2020
PULITURA DEL PARAMENTO LITOIDE	1	E	1	1	06/07/2020	06/07/2020
Reintegrazione di lacune e ripresa di muratura in caso di crolli,	1	E	3	3	23/06/2020	25/06/2020
Stilatura dei giunti. Rimozione delle parti di malte interstiziali tra i conci,	1	E	1	1	26/06/2020	26/06/2020
	1	E	3	3	29/06/2020	01/07/2020
Sarcitura di grosse lesioni strutturali da 2 a 5 cm di murature	1	E	2	2	06/07/2020	07/07/2020
Iniezioni di consolidamento strutturale di murature faccia vista	1	E	2	2	08/07/2020	09/07/2020
Impermeabilizzazione con malta cementizia.	1	E	2	2	09/07/2020	10/07/2020
Restauro ed impermeabilizzazione delle sommità	1	E	1	1	13/07/2020	13/07/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA


I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:


E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

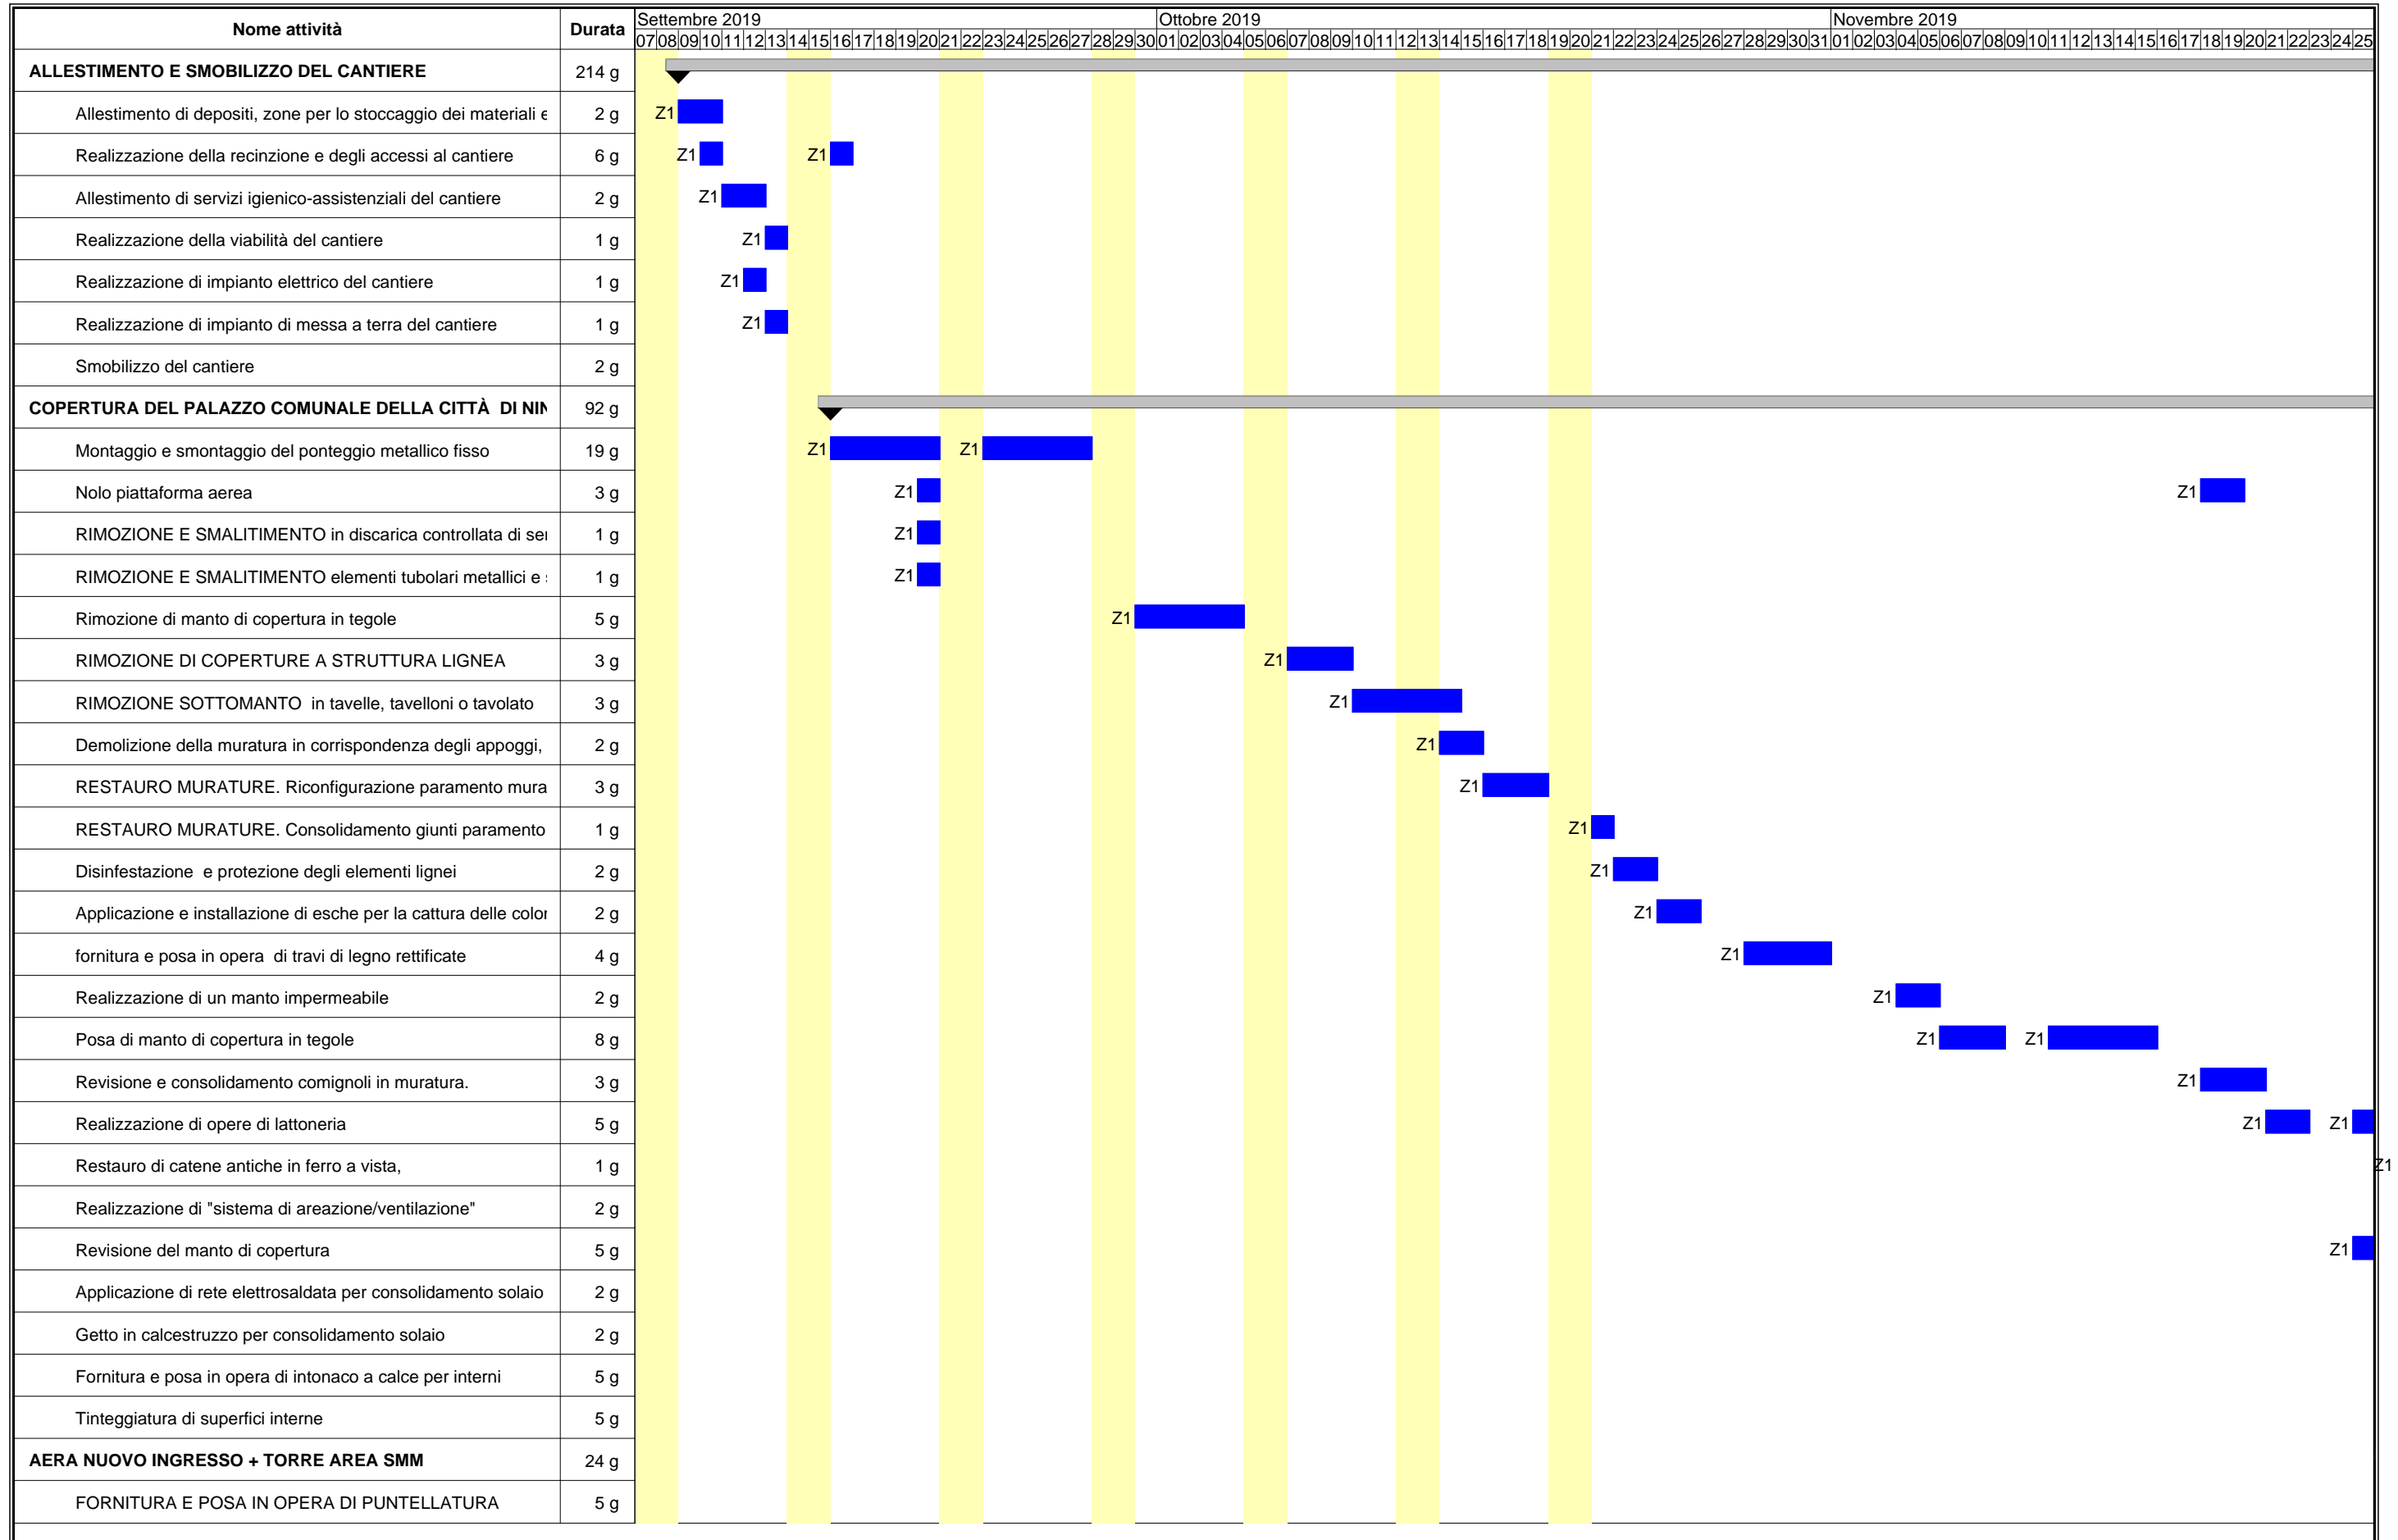


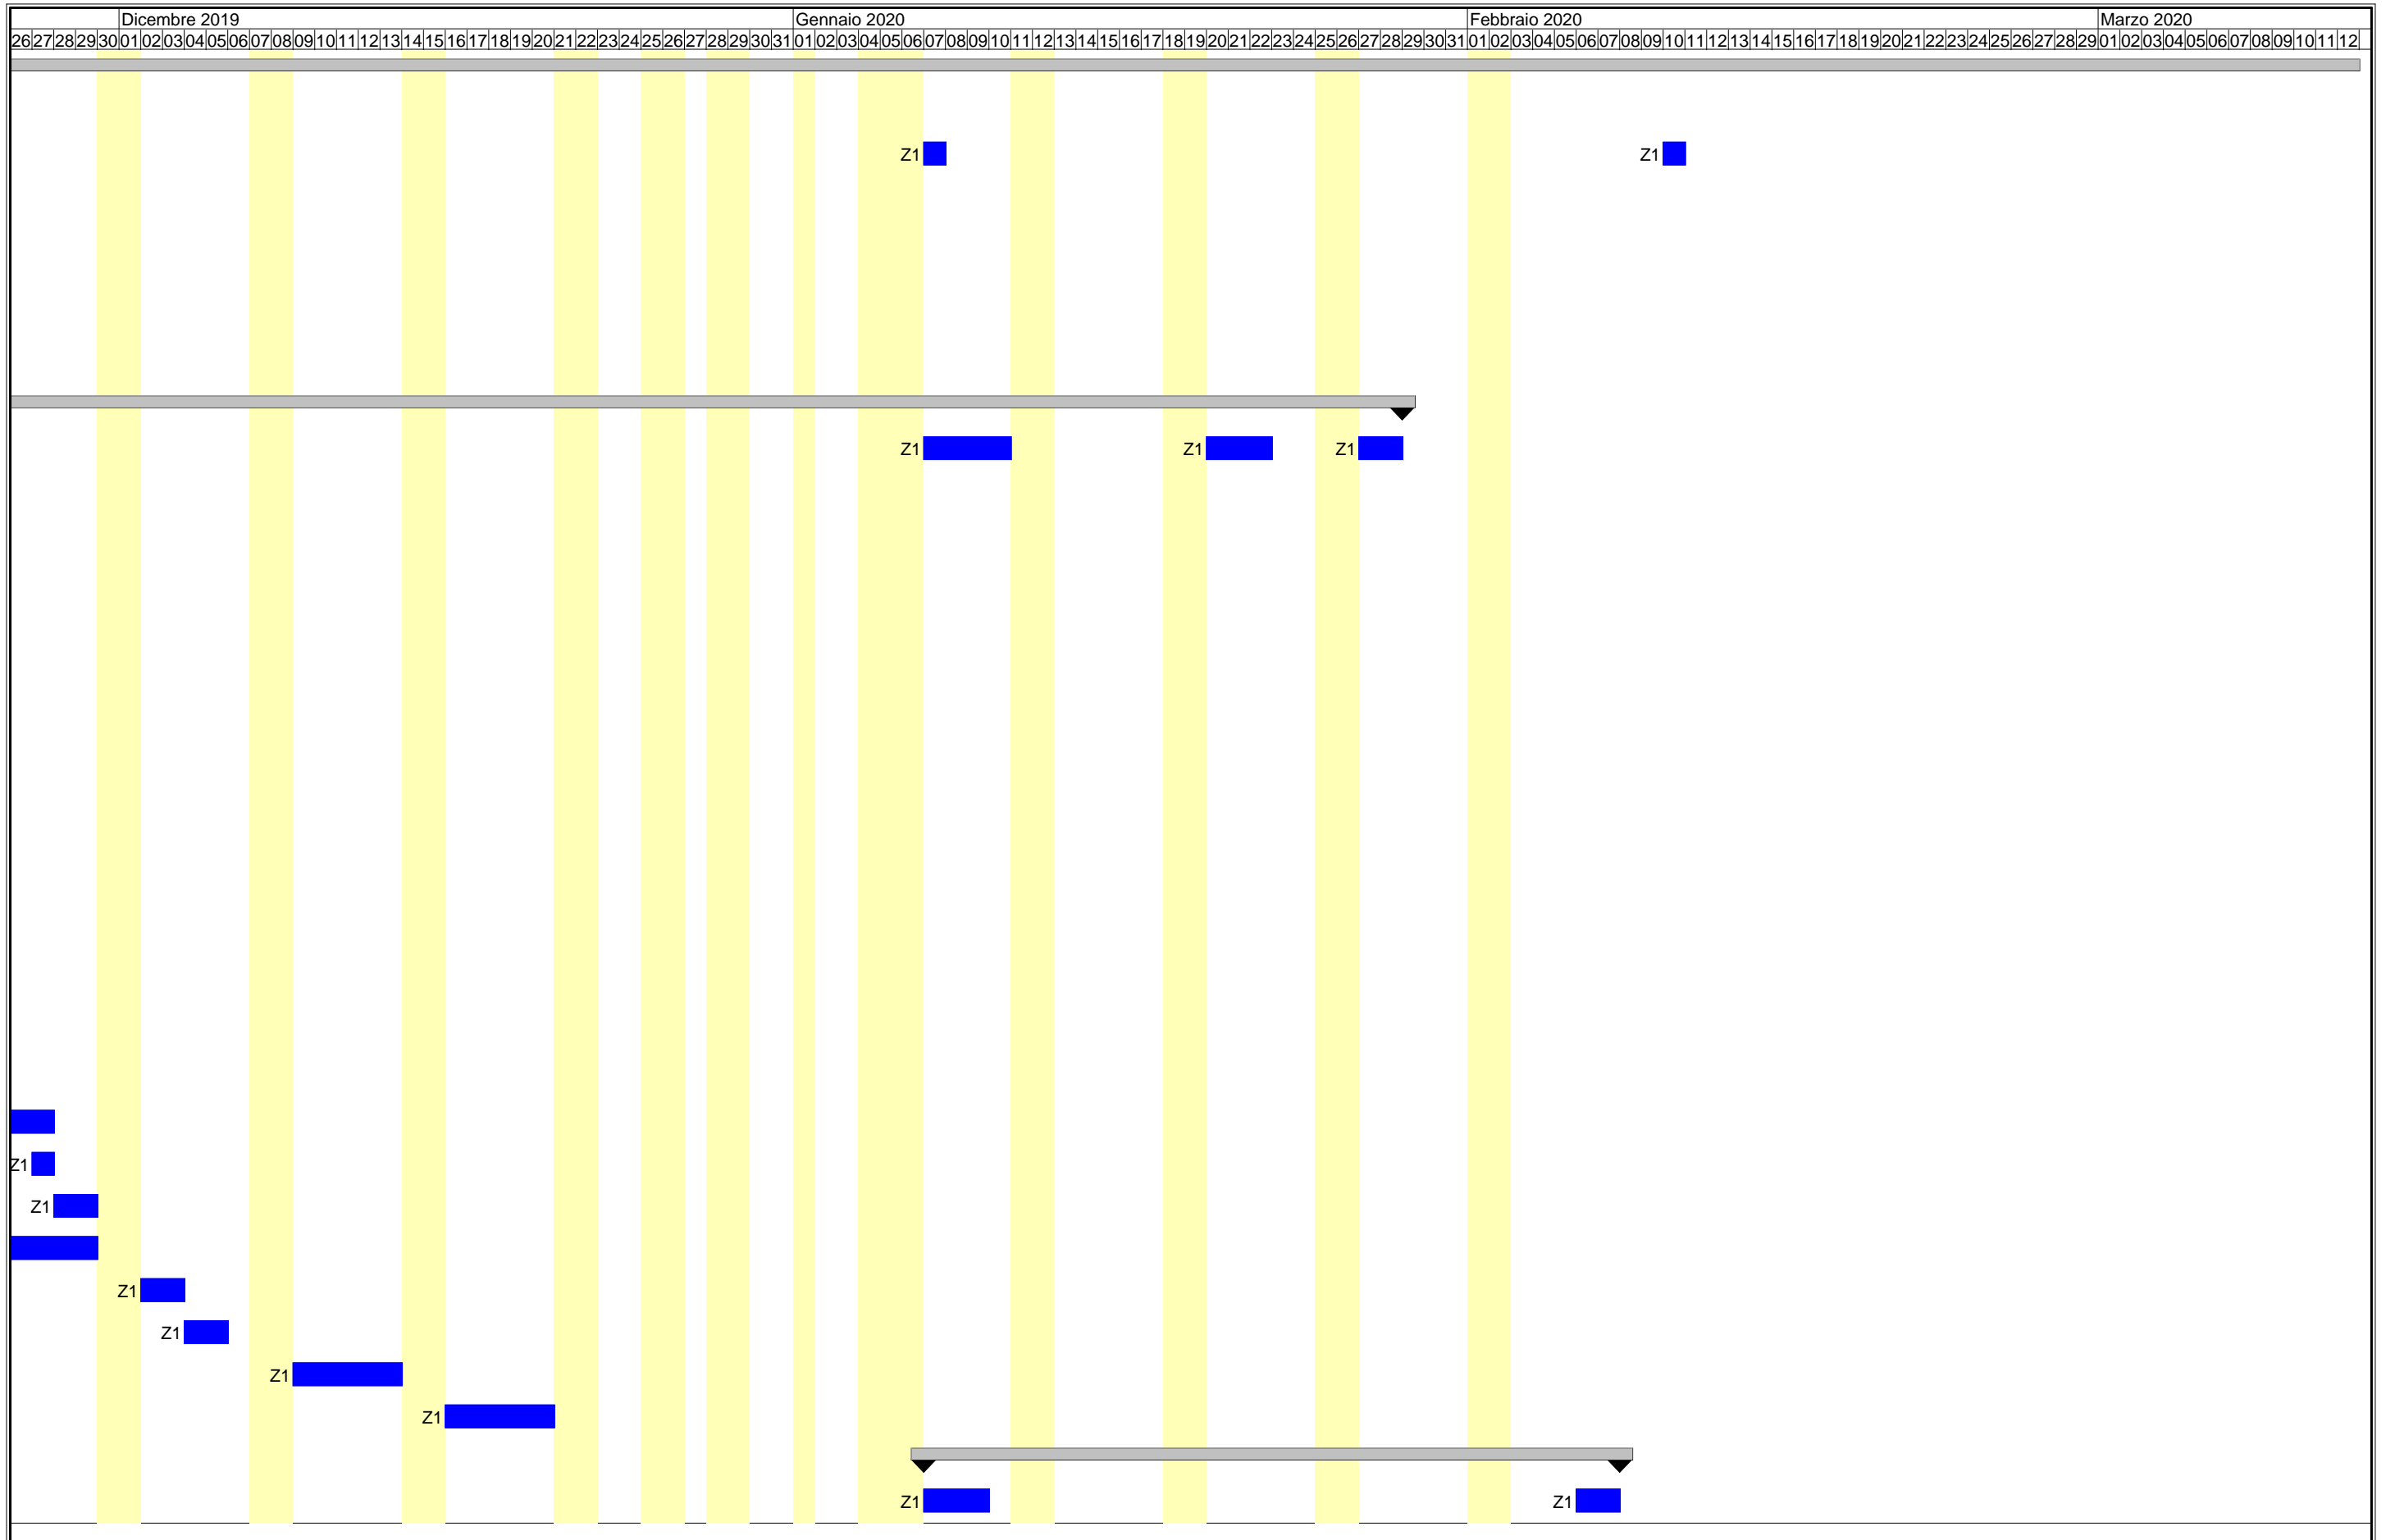

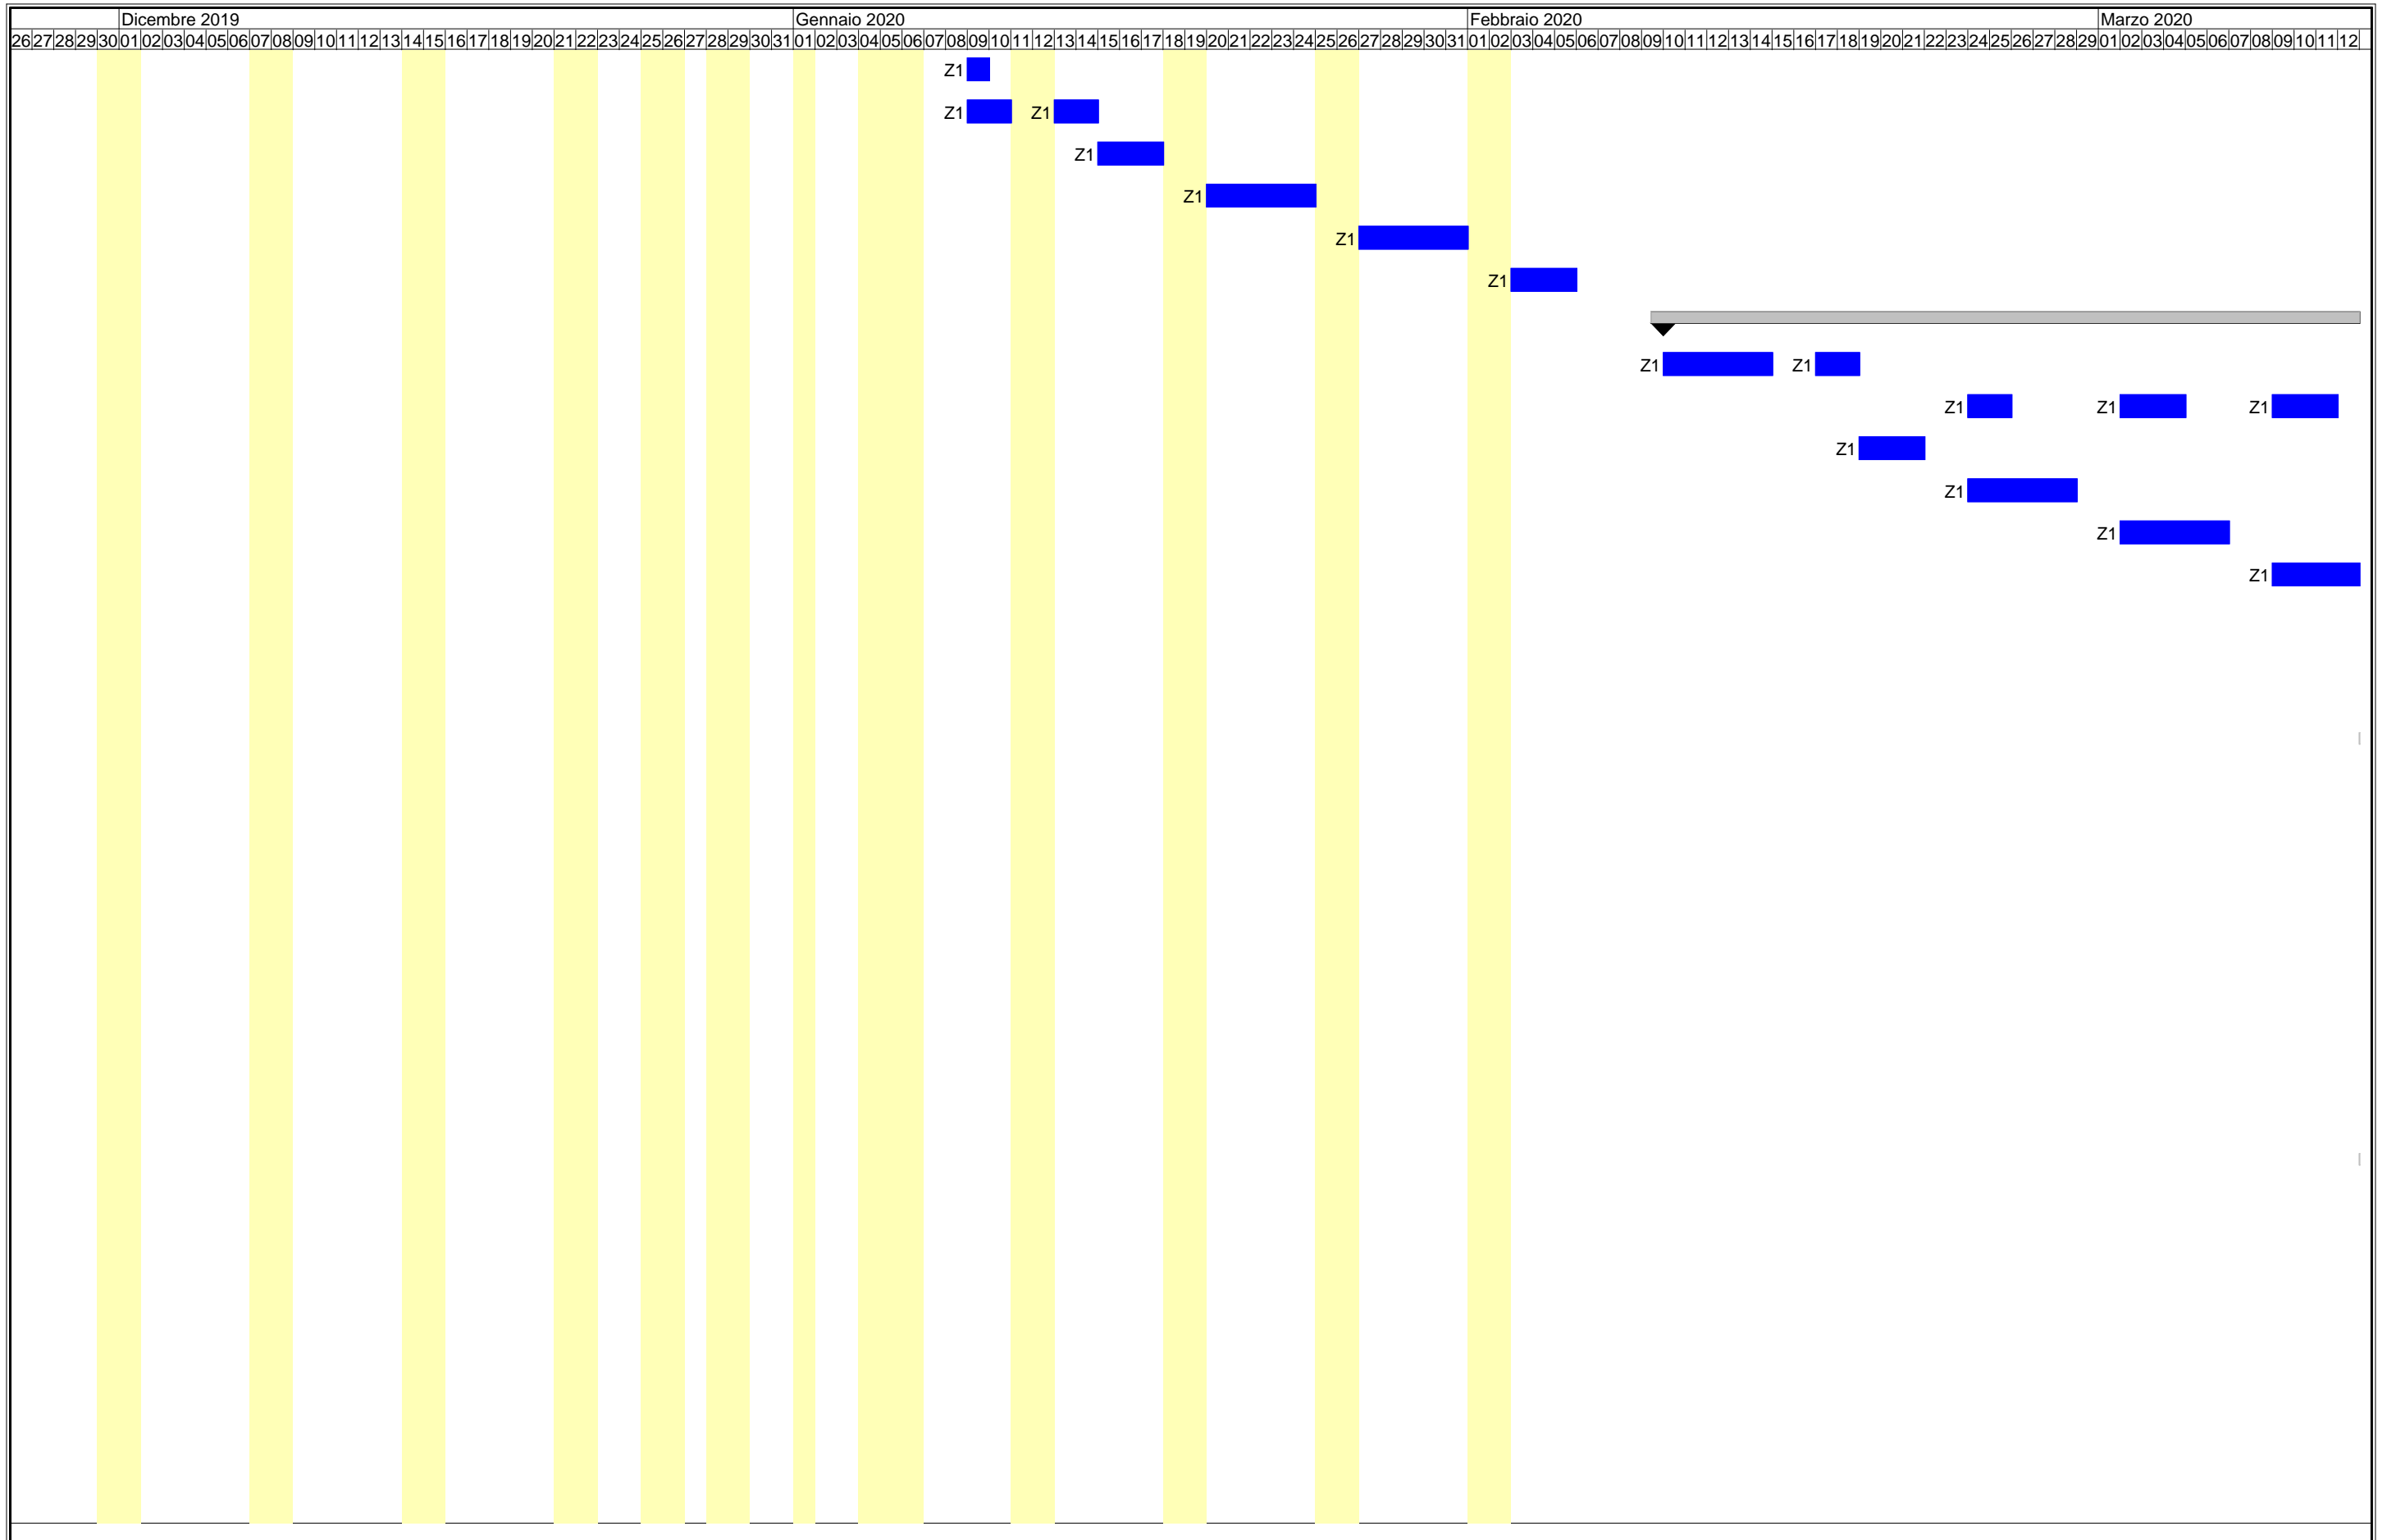

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Aprile 2020 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Maggio 2020 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Giugno 2020



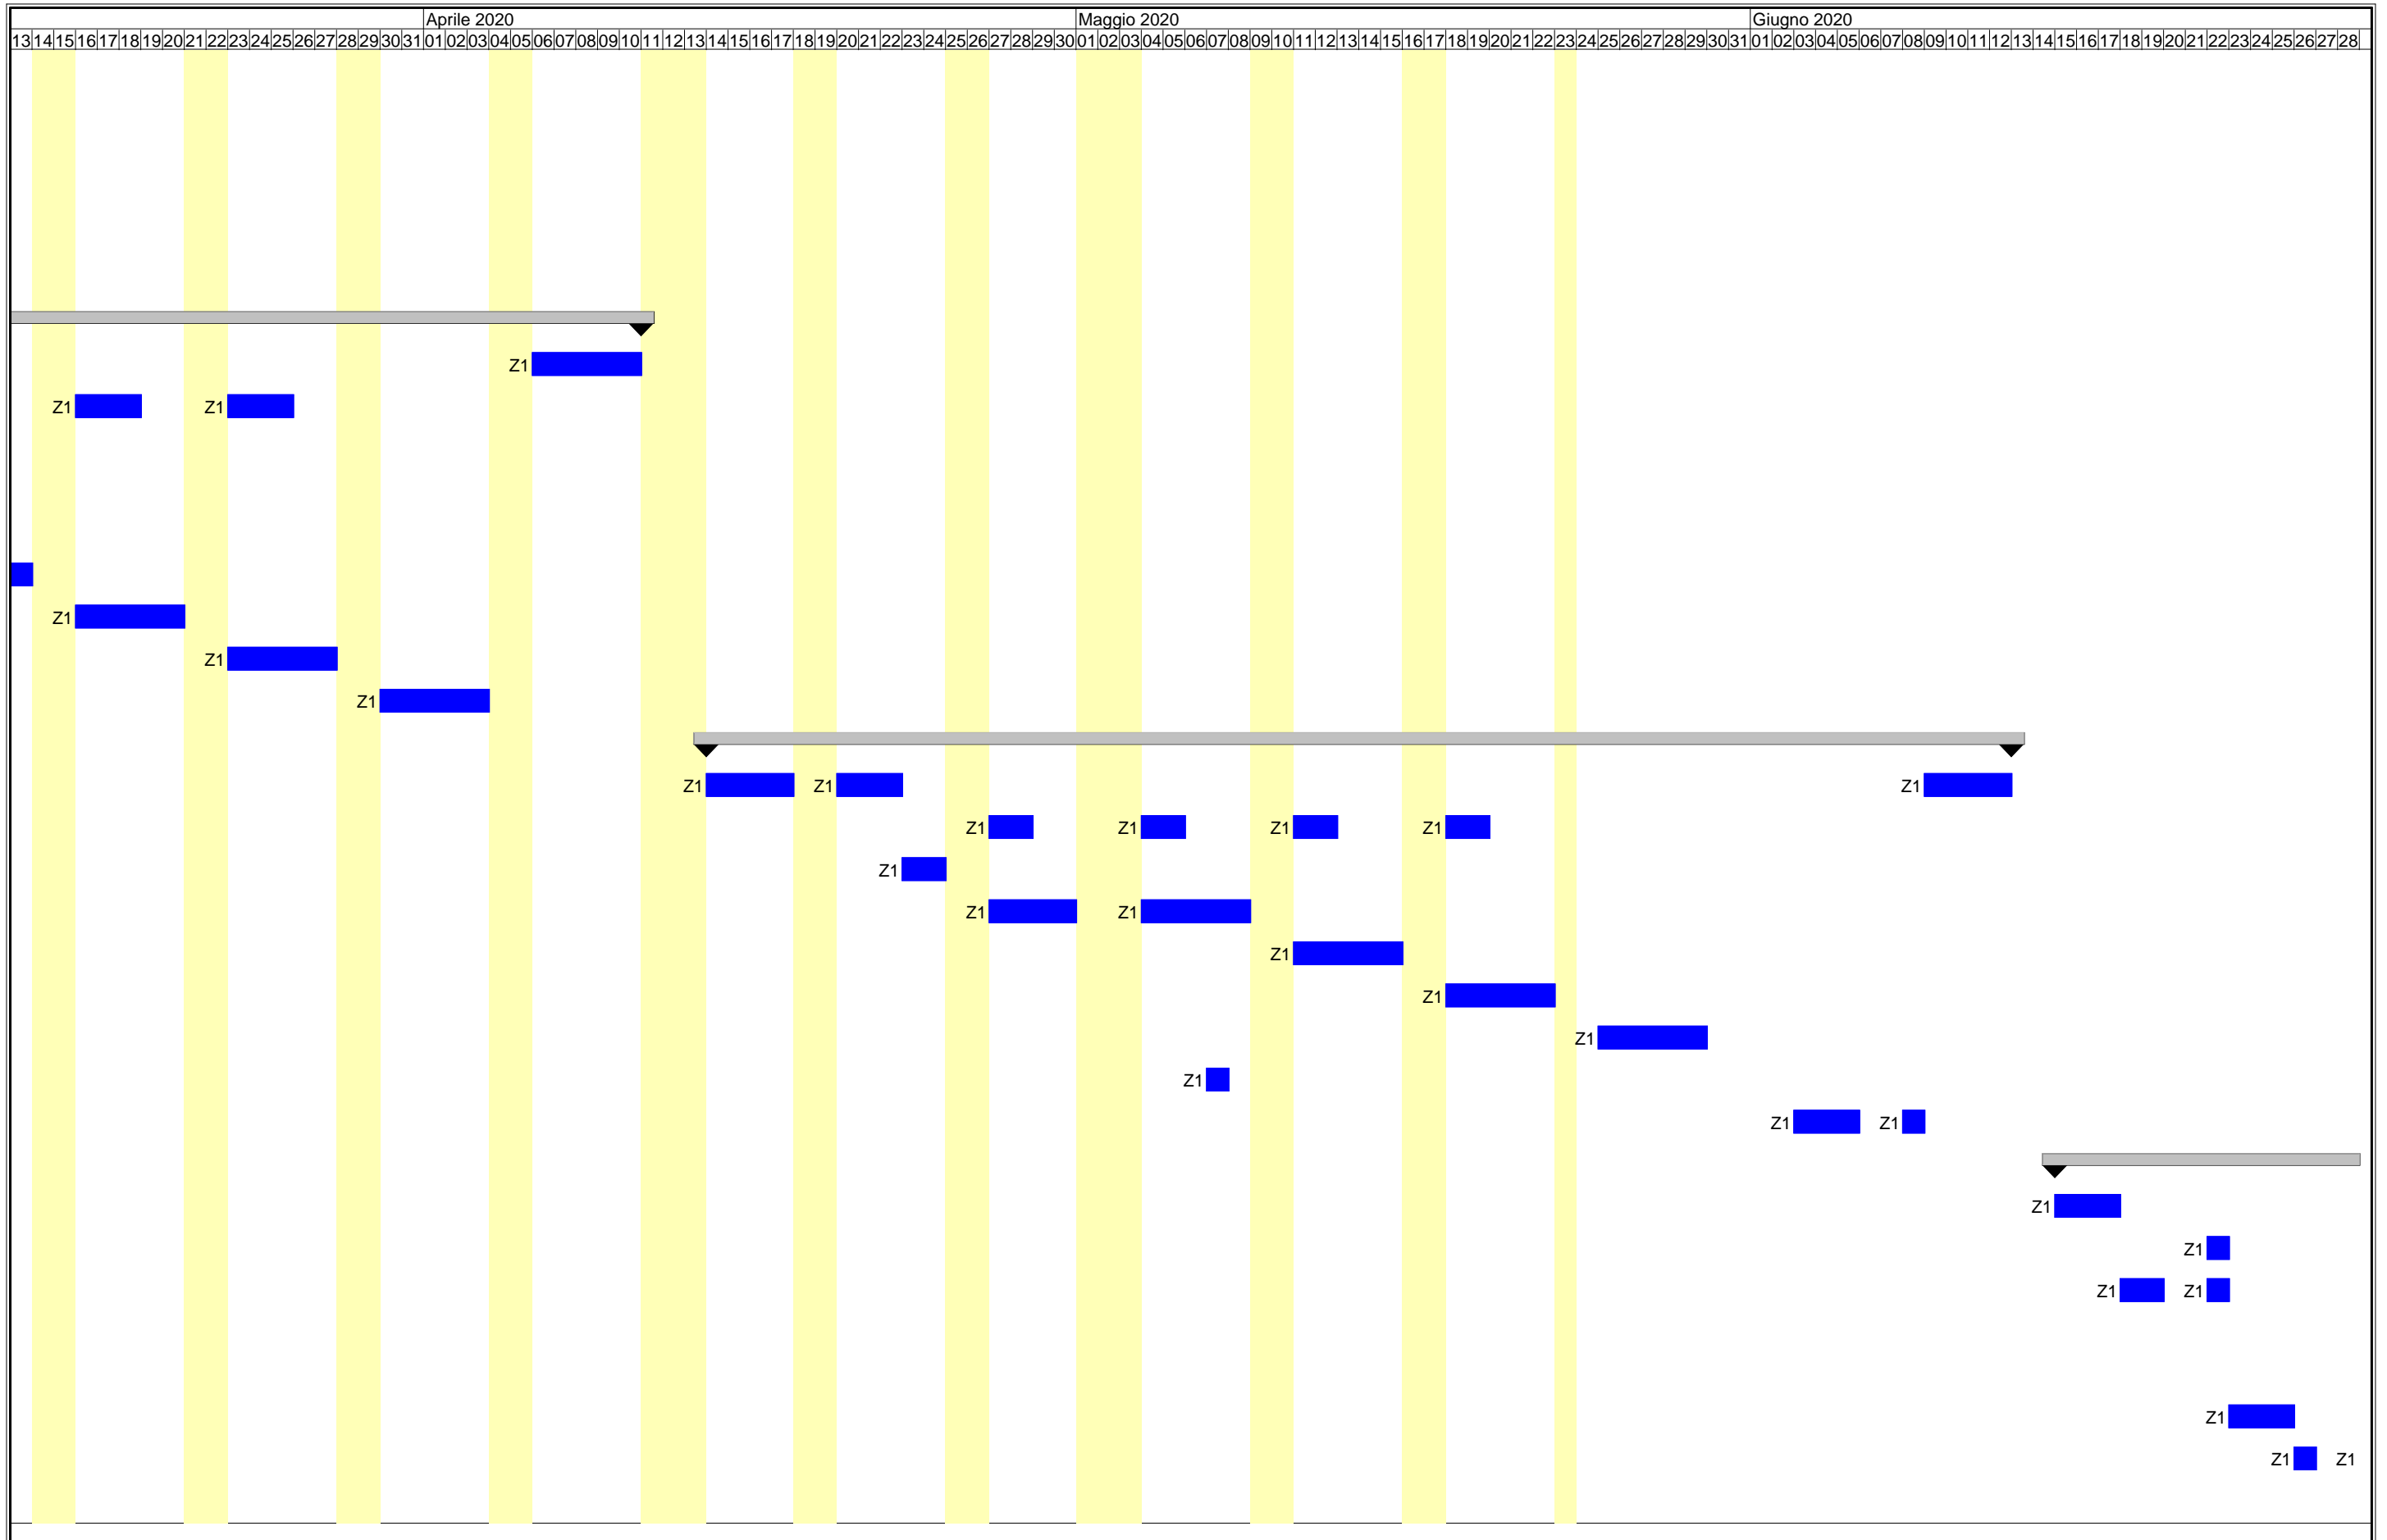

Aprile 2020											Maggio 2020											Giugno 2020																																																							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
[Empty cells for the main data area]																																																																													

